

SYU PMS 신입사원 사용 안내서

화면을 따라 하며 배우는 수주 프로젝트 관리

발행일 2026-07-04 · Rev. 2.0

들어가며 — 이 시스템은 무엇을 하나요?

안녕하세요. SYU PMS에 오신 것을 환영합니다. 이 시스템은 우리 회사가 **수주받아 만드는 제품 (열교환기·탱크·압축기 패키지 등)**을 **계약부터 납품·정산까지 한 곳에서** 관리하는 프로그램입니다.

쉽게 말해, 하나의 “수주(=프로젝트)”를 열면 그 안에 **자재표(BOM), 일정, 발주, 제작 진척, 대금 (기성), 회계, 투입 인력**이 모두 들어 있습니다. 담당자는 자기 업무 화면에 값을 입력하기만 하면 되고, 시스템이 진척률·성과지표·노무비를 자동으로 계산해 줍니다.

이 안내서는 **처음 쓰는 분**을 위해 화면을 하나씩 보여주며 “여기서 무엇을 누르고, 무엇을 입력하는지”를 설명합니다. 순서대로 따라오시면 됩니다.

접속: 회사에서 안내한 주소로 브라우저(크롬 권장) 접속 → 이메일·비밀번호로 로그인.
계정이 없으면 하단 ‘회원가입’ 후 관리자에게 프로젝트 멤버 등록을 요청하세요.

1. 전체 흐름 한눈에 보기

먼저 큰 그림입니다. 우리 업무는 아래 순서로 흘러갑니다. 지금 다 이해하지 않아도 괜찮아요. “아, 이런 흐름이구나” 정도만 눈에 익혀 두세요.

SYU PMS — 수주생산(ETO) 프로세스 맵

도면 수주부터 설계·조달·제작·검사·납품·정산까지 / 일정·성과(EVM)·리스크·인력·대금·회계를 상시 관리

① 수주 등록·기준정보



② 표준 실행 단계 (Work Packages - 간트)



③ 조달·발주 (리드타임 L/T 기반)



④ 상시 모니터링·통제 (전 단계 병행)



별매 설계·계약 조달·제작 검사·납품·정산 대금·회계 주의(물리드·검사) 실선=업무 흐름·점선=데이터/피드백

SYU PMS · Next.js + Supabase + Claude · 문서 생성일 2026-07-04

전체 프로세스 맵

- ① 수주 등록 — 도면을 올리면 AI가 자재표(BOM)를 읽어 프로젝트를 만들어 줍니다.
- ② 실행 단계 — 설계 → 조달 → 제작 → 조립 → FAT(공장검사) → 납품 → 정산.
- ③ 조달·발주 — 자재의 리드타임(L/T)을 계산해 언제 발주할지 자동으로 잡아 줍니다.
- ④ 상시 관리 — 일정·성과(EVM)·리스크·인력·대금·회계를 전 과정 내내 지켜봅니다.

2. 첫 화면 — 수주 목록

로그인하면 수주 목록 화면이 나옵니다. 우리 회사가 진행 중인 모든 수주가 표로 보입니다.

SYU · PMS 수주 전사 현황 인력				
수주 프로젝트				
수주 목록				
진행 중인 수주·제작 프로젝트를 관리합니다. 총 3건				
			도면으로 수주 생성	+ 신규 수주 등록
#	프로젝트	발주처 / 최종수요처	상태	
1	☐ 삼성LNG교반기	삼성중공업 · 삼성중공업 거제조선소	진행	열기 →
2	☐ 800 GALLON DAY TANK	발주처 미지정	계획	열기 →
3	☐ 창원 수소충전기 압축기 패키지	SK 에너지 · 창원 수소 충전소	계획	열기 →

수주 목록 화면

무엇을 보는 곳인가요? 각 줄이 하나의 수주입니다. 프로젝트명, 발주처, 진행 상태(진행·계획·완료 등)를 한눈에 볼 수 있어요. 맨 위 파란 바(상단바)에는 항상 수주 / 전사 현황 / 인력 메뉴와, 오른쪽에 알림·설정·로그아웃이 있습니다.

신입사원이 해볼 것

1. 담당 수주의 이름 또는 오른쪽 **열기** → 를 누르면 그 프로젝트 안으로 들어갑니다.
2. 새 수주를 만들 때는 오른쪽 위 + **신규 수주 등록**(직접 입력) 또는 **도면으로 수주 생성**(도면 자동 인식)을 사용합니다.

팁: 처음에는 아무것도 누르지 말고, 담당 프로젝트를 ‘열기’ 해서 안을 둘러보는 것부터 시작하세요.

3. 도면으로 수주 만들기 (AI 자동 인식)

새 제품을 수주하면 보통 도면이 함께 옵니다. **도면으로 수주 생성**을 쓰면, 도면 속 자재표를 AI가 읽어 자동으로 품목을 채워 줍니다. 타이핑을 크게 줄여 주는 기능이에요.


따라 하기

1. 수주 목록에서 **도면으로 수주 생성**을 누릅니다.
2. **파일 선택** → 도면(PDF·이미지)을 고릅니다. 오른쪽에 도면 미리보기가 뜹니다.
3. **도면 분석**을 누르고 잠시(최대 1분) 기다리면, 왼쪽 표에 품명·수량·규격·구매구분이 자동으로 채워집니다.
4. 값이 맞는지 눈으로 확인·수정합니다. (AI가 읽은 것이라 담당자 확인은 꼭 필요해요.)
5. **프로젝트 생성 + BOM 저장**을 누르면 수주가 만들어지고 표준 8단계가 자동으로 세팅됩니다.

‘구매구분’은 구매품/외주품/자사생산품 중 하나로 자동 분류됩니다. 예: “가공·용접”이 들어간 품목은 외주품으로 잡아 줍니다. 틀리면 직접 바꿔 주세요.

4. 프로젝트 대시보드 — 현황 요약

프로젝트를 열면 가장 먼저 **대시보드**가 나옵니다. 이 프로젝트가 지금 어떤 상태인지 요약해서 보여주는 화면이에요.

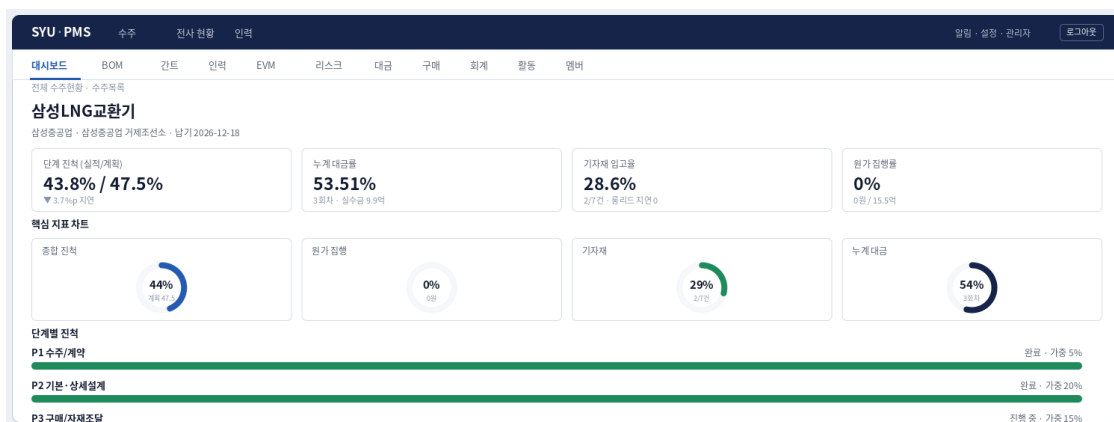

프로젝트 대시보드 화면

위쪽 KPI 카드 4개 (가장 중요)

- **단계 진척(실적/계획)** — 예: 43.8% / 47.5%. 실적이 계획보다 낮으면 “지연”으로 빨강게 표시됩니다.
- **누계 대금률** — 지금까지 청구·수금된 기성 비율.
- **기자재 입고율** — 발주한 자재가 얼마나 들어왔는지.
- **원가 집행률** — 실행예산 대비 실제 투입 원가.

가운데 원형 차트는 위 지표를 그림으로, **아래 단계별 진척 막대**는 P1~P8 각 단계의 실적/계획 진척을 보여줍니다. 초록은 완료, 파랑은 진행 중입니다.

오른쪽 AI 어시스턴트: “상세설계 진척 70%로 갱신해줘” 처럼 **자연어로 명령**하면 시스템이 대신 처리해 줍니다. 익숙해지면 아주 편한 기능이에요.

상단 탭(대시보드·BOM·간트·인력·EVM·리스크·대금·구매·회계)으로 세부 화면을 오갑니다. 아래에서 하나씩 볼게요.

5. BOM — 자재 명세 관리

BOM 탭은 이 제품을 만드는 데 필요한 **모든 자재의 목록**입니다. 제작·구매의 기준이 되는 가장 중요한 데이터예요.

SYU PMS | 수주 | 진사 현황 | 인력 | 알림 | 설정 | 관리자 | 로그아웃

대시보드 | **BOM** | 간트 | 인력 | EVM | 리스크 | 대금 | 구매 | 회계 | 활동 | 멤버

삼성LNG교반기

BOM 기준정보

구매품 9건 121,960,000원	외주품 3건 262,000,000원	자사생산품 4건 57,300,000원	합계 14행 441,260,000원
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

발주(PO) 자동생성 기준: 납기역산 납기일 ☐ 발주 생성

#	품명	수량	구매구분	L/T주	금액
1	TEMPERATURE SWITCH	1	구매품	3	—
2	U-Tube Bundle STS316L	1	외주품	12	142,000,000
3	Tubesheet STS316L	2	외주품	10	52,000,000
4	WN Flange STS316L	12	구매품	4	10,200,000

하단 고정 바: 총 14행 · 합계 441,260,000원 (+ 품목 추가) [전체 저장]

BOM 기준정보 화면

위쪽 집계 카드: 구매품·외주품·자사생산품이 각각 몇 건·얼마인지, 그리고 전체 합계를 보여줍니다.

표에서 입력하는 것

- **구매구분** — 구매품/외주품/자사생산품 선택.
- **L/T주** — 리드타임(발주부터 입고까지 걸리는 주). 8주 이상이면 “롱리드”로 빨강게 표시되어 먼저 챙겨야 할 품목임을 알려줍니다.
- **단가** — 입력하면 금액(단가×수량)이 자동 계산됩니다.

저장 방법: 한 줄만 고쳤으면 그 줄의 **저장**, 여러 줄을 고쳤으면 화면 맨 아래 고정 바의 **전체 저장**을 누르세요.

발주(PO) 자동생성: 위쪽 바에서 기준(납기 역산/착수 정산)을 고르고 **발주 생성**을 누르면, 구매 품·외주품이 리드타임에 맞춰 **구매 탭**에 발주로 자동 생성됩니다.

6. 간트 · 단계 계획 — 일정 관리

간트 탭에서는 프로젝트 일정을 세우고 단계별 진척을 입력합니다.



간트 · 단계 계획 화면

따라 하기

1. 위쪽 **기본 일정 자동배분**에 착수일과 납기를 넣고 **가중치대로 배분**을 누르면, 모든 단계의 계획 시작·종료가 비중대로 자동으로 채워집니다. (일정을 처음 잡을 때 아주 편해요.)
2. 아래 표에서 각 단계의 **계획 예산**과 **계획 진척%**·**실적 진척%**를 입력하고 **저장**합니다.
3. 위쪽 간트차트에 막대로 표시되어 한눈에 보입니다.

여기서 넣은 계획 예산 합계가 다음 장의 EVM에서 “총예산(BAC)”으로, 진척값이 진척 그래프로 그대로 쓰입니다. 그래서 정확히 입력하는 게 중요해요.

7. EVM · 리스크 · 구매 · 대금 · 회계 (요약)

각 탭은 담당 업무에 따라 사용합니다. 처음에는 “어떤 화면인지”만 알아두고, 본인 업무 화면부터 익히면 됩니다.

EVM(성과분석) — 계획 대비 실제 성과를 숫자로 봅니다. 핵심은 두 지표예요. CPI(원가효율)와 SPI(일정효율)가 **1보다 작으면 각각 예산 초과·일정 지연**을 뜻합니다. S-curve 그래프로 추세도 봅니다.

리스크 — 프로젝트 위험을 등록합니다. 발생확률(1~5)과 영향(1~5)을 넣으면 **스코어(확률×영향)**가 자동 계산되어 우선순위가 정해집니다.

구매 — BOM에서 만들어진 발주(PO)를 관리합니다. 발주일·입고예정(ETA)·상태(발주→이송→입고→검사)와 롱리드 품목을 추적합니다.

대금 — 기성(회차별 대금)을 관리합니다. 회차·금액·기성률·상태(청구→확정→지급)와 유보율을 입력합니다.

회계 — 기성·원가·구매에서 매출·원가·미수가 복식부기 **전표**로 자동 기표되어, 프로젝트 회계 현황을 바로 볼 수 있습니다.

8. 인력 관리 — 사원 등록 (엑셀 업로드)

상단 메뉴 **인력**은 전사 인력을 관리하는 곳입니다. (관리자 권한)

The screenshot shows the '인력 관리' (HR Management) page in the SYU-PMS system. At the top, there are tabs for '전사 인력 통' (All HR Summary), '인력 관리' (HR Management), and '로그아웃' (Logout). Below the tabs, there are four summary boxes: '등록 인력' (Registered HR) with 5명, '활성 인력' (Active HR) with 5명, '과배정' (Over-allocation) with 0명, and '부서 수' (Number of Departments) with 5. To the right of these boxes are buttons for '엑셀 양식 다운로드' (Download Excel Template), '엑셀 업로드' (Upload Excel), and '내보내기' (Export). Below the summary boxes is a filter bar with checkboxes for '인력 추가 사원' (Add HR), '사원명' (Employee Name), '직급' (Job Grade), '부서' (Department), '직종' (Job Type), and '월단가' (Monthly Rate), followed by a '+ 추가' (+ Add) button. The main part of the page is a table with 7 columns: 사번 (Employee ID), 사원명 (Employee Name), 직급 (Job Grade), 부서 (Department), 직종 (Job Type), 월단가 (Monthly Rate), and 가동% (Usage %). The table contains 3 rows of data.

사번	사원명	직급	부서	직종	월단가	가동%
S2107	김도현	부장	사업관리	PM	12,000,000	100
S2214	이수민	책임	설계	설계	8,500,000	100
S2033	박정우	기장	생산	용접	7,000,000	100

인력 관리 화면

한 명씩 추가: 위쪽 '인력 추가' 줄에 **사번·사원명·직급·부서·직종·월단가**를 넣고 + 추가.

엑셀로 여러 명 한 번에 등록

1. **엑셀 양식 다운로드**를 눌러 양식 파일을 받습니다.
2. 엑셀에서 사번·사원명·직급·부서·직종·월단가·가동률 등을 채우고 CSV로 저장합니다.
3. **엑셀 업로드**로 그 파일을 올리면 됩니다. **사번이 같으면 갱신, 없으면 신규**로 등록됩니다.
4. 현재 인력을 내려받으려면 **내보내기**를 씁니다.

월단가는 뒤에서 노무비(월단가 × 투입 M/M)를 계산하는 데 씁니다. 정확히 넣어 주세요.

9. 인력 배정 — 프로젝트에 사람 붙이기

프로젝트 탭의 **인력**에서 그 프로젝트에 사람을 배정합니다.

SVU - PMS

수주진사현황인력

알림 · 설정 · 관리자로그아웃

대시보드BOM간트인력EVM리스크대금구매회계활동멤버

상 전,NG공황기

인력 배정

투입 인원
5명

계획 M/M
23.4

계획 노무비
205,250,000원
#245ab0

인력 배정

사번

인력

직급

직종

역할

배정%

M/M

계획 노무비

S2107

김도현

부장

PM

PM(총괄)

60

6

72,000,000

S2214

이수민

책임

설계

상세설계 리드

100

3.5

29,750,000

S2033

박정우

기장

융합

융합 반장

100

5.5

38,500,000

+ 인력 배정

인력 배정 화면

따라 하기

1. + 인력 배정을 누릅니다.
2. 인력(사번·이름·직급이 함께 보임)·역할·배정%·계획 M/M·기간을 넣고 배정.
3. 위쪽 KPI에 투입 인원·계획 M/M·계획 노무비가 자동 집계됩니다. (계획 노무비 = 월단가 × 계획 M/M)

같은 사람이 여러 프로젝트에 동시에 너무 많이 배정되면 인력 관리 화면에서 과배정으로 빨강게 알려줍니다.

10. 설정 · 수주 삭제 (관리자)

오른쪽 위 설정에서 관리 기능을 씁니다. (관리자 권한)

- **ERP 연동** — 모듈별로 ERP와 주고받는 방식을 설정합니다.
- **수주 관리(삭제)** — 잘못 만든 수주를 지웁니다. 실수 방지를 위해 수주명을 정확히 입력해야 삭제가 확정됩니다. 삭제하면 그 수주의 BOM·일정·구매·대금·회계가 함께 영구 삭제되니 신중히 하세요.

11. 하루 업무 순서 정리

신입사원이 실제로 일하는 순서를 정리하면 이렇습니다.

1. 로그인 → 담당 수주 열기 → 대시보드로 현황 파악.
2. 본인 담당 탭에서 값 입력·저장 (예: 제작 담당이면 간트에서 실적 진척 갱신, 구매 담당이면 구매 탭에서 입고 상태 갱신).
3. 이상 징후(지연·롱리드 지연·과배정)는 대시보드/알림에서 확인하고 팀에 공유.
4. 모르면 오른쪽 AI 어시스턴트에 자연어로 물어보거나 관리자에게 문의.

자주 헛갈리는 점

- 표를 여러 줄 고쳤는데 저장이 안 됐다? → 맨 아래 전체 저장을 눌렀는지 확인.
- 발주 생성이 안 된다? → 구매품·외주품만 발주가 생성됩니다.

- 인력 배정에 사람이 안 보인다? → 상단 **인력** 메뉴에서 먼저 등록/엑셀 업로드.

환영합니다. 처음에는 담당 화면 한두 개만 익히면 충분합니다. 나머지는 쓰면서 자연스럽게 익숙해집니다.

화면 이미지는 실제 SYU PMS 화면을 그대로 반영한 예시입니다. 실제 값은 프로젝트마다 다릅니다. (Rev. 2.0)
